

Anexo No. 17: Planilla de medición y evaluación de los niveles de iluminación-Condomini

PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION								
INSTALACION : Construccion Condominio Torre Alto					Horario de medicion: 09:00 am-11:00			
FECHA DE INICIO: 20 de Octubre 2018					EQUIPO: Luxometro			
FECHA DE FINALIZACION:30 de Octubre 2018					MODELO: TESTO 540			
No.	Puesto de trabajo/actividad	Nivel de luminacia requerido	medicion de iluminancia (Lux)			Resultados		
						min	max	promedio
1	Area taller	75	50	48,5	51	48,5	53	51
2	pasillos transitados	25	0	0	0	0	0	0
3	pasillos transitados	25	0	0	0	0	0	0
4	pasillos transitados	25	26	23	26	24	26	25
5	pasillos transitados	25	0	0	0	0	0	0
6	pasillos transitados	25	0	0	0	0	0	0
7	revoque interior de cemento	75	48,7	53	53	48,5	53	50,75
8	revoque interior de cemento	75	58,5	56	56	56	58,5	57,25
9	revoque interior de cemento	75	85	84,9	84,8	84,8	85	84,9
10	revoque interior de cemento	75	76	78,6	77	76	78,6	77,3
11	revoque interior de cemento	75	120	117,5	117,4	117,4	120	118,7
12	revoque interior de cemento	75	40	38,2	38,5	38,2	40	39,1
13	revoque interior de cemento	75	112	111	111	111	112	111,5
14	instalacion de tuberias de gas	75	85	84,9	84,8	84,8	85	84,9
15	escritorio 1	75	540	539,4	539	539	539,4	539,2
16	escritorio 2	75	440	440	437,8	437,8	440	438,9
17	escritorio 3	75	436	436	436	436	436	436
18	escritorio 4	75	450	450	449	449	450	449,5
19	revoque interior de cemento	75	79	82	81,3	79	82	80,5

20	revoque interior de cemento	75	16	15	16	15	16	15,5
21	revoque interior de cemento	75	14	15	17	14	17	15,5
22	revoque interior de cemento	75	0	0	0	0	0	0
23	revoque interior de cemento	75	48,4	47,5	47,3	47,3	48,4	47,85
24	revoque interior de cemento	75	8	7	6	6	8	7
25	levantamiento de muro de ladrillo	75	89	89	89	89	89	89
26	levantamiento de muro de ladrillo	75	102	102	101	101	102	101,5
27	levantamiento de muro de ladrillo	75	105	104,7	105	104,7	105	104,85
28	revoque con lechada	75	12	15	13	12	15	13,5
29	revoque con lechada	75	30	29	30	29	30	29,5
30	revoque con yeso	75	34	34	34	34	34	34

OBSERVACION:

Las mediciones se realizaron con un luxómetro de propiedad de la Universidad





io Torre Alto Verde

[illegible]

no cumple	ninguna
no cumple	ninguna
no cumple	ninguna
no cumple	ninguna
no cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
no cumple	ninguna
no cumple	ninguna
no cumple	ninguna

Anexo No. 18: Planilla de medición y evaluación de los niveles de iluminación-Puente 4 d

PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION								
INSTALACION : Construccion Puente 4 de Julio					Horario de medicion: 09:00 am-11:00			
FECHA DE INICIO: 20 de Octubre 2018					EQUIPO: Luxometro			
FECHA DE FINALIZACION: 5 de Noviembre 2018					MODELO: TESTO 540			
No.	Puesto de trabajo/actividad	Nivel de luminancia requerido	medicion de iluminancia (Lux)			Resultados		
						min	max	promedio
1	Area taller	75	150	150	150	150	150	150
2	trabajo a cielo abierto	75	28000	28000	28000	28000	28000	28000
3	escritorio 1	75	400	399	400	399	400	399,5
4	escritorio 2	75	450	448	448	448	450	449
5	escritorio 3	75	480	478	475	475	480	477,5
6	escritorio 4	75	480	480	480	480	480	480

OBSERVACION:

Las mediciones se realizo con un luxometro de propiedad de la Universidad



e Julio.

) am 03pm-06-pm	
cumple/ no cumple	Obs.
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
no cumple	ninguna
no cumple	ninguna

Anexo No. 1: Planilla de medición y evaluación de los niveles de iluminación-Materno Inf

PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION								
INSTALACION : Construccion Hospital Oncologico						Horario de medicion: 09:00 am-11:00		
FECHA DE INICIO: 15 de Agosto						EQUIPO: Luxometro		
FECHA DE FINALIZACION:15 de septiembre						MODELO: TESTO 540		
No.	Puesto de trabajo/actividad	Nivel de luminancia requerido	medicion de iluminancia (Lux)			Resultados		
						min	max	promedio
1	Area taller	75	80	82	81	80	82	81
2	pasillos transitados	25	30	30	28	28	30	29
3	pasillos transitados	25	30	31	30	30	31	30,5
4	pasillos transitados	25	15	17	15	15	17	16
5	pasillos transitados	25	19,8	20	23	19,8	23	21,4
6	pasillos transitados	30	30	30	30	30	30	30
7	pasillos transitados	25	26	25,8	25,8	25,8	26	25,9
8	pasillos transitados	25	27	27	27	27	27	27
9	pasillos transitados	25	22	25	25	22	25	23,5
10	pasillos transitados	35	35	35	35	35	35	35
11	uso de combo en colodaco de puertas	75	80	85	83	80	85	82,5
12	uso de combo en colodaco de puertas	75	85	87	87	85	87	86
13	revoque interior de cemento	75	120	119	119,8	119	120	119,5
14	colocado de marcos de puertas	75	118	119,5	120	118	120	119
15	revoque interior de cemento	75	118	117,8	117,8	118	117,9	117,95

16	revoque interior de cemento	75	122	121,5	121,5	121,5	122	121,75
17	revoque interior de cemento	75	125	124,6	123	123	125	124
18	Colocado de muros	75	123	123	123	123	123	123
19	escritorio 1	75	430	430	430	430	430	430
20	escritorio 2	75	448	447	446,8	446,8	448	447,4
21	escritorio 3	75	336	335	332	332	336	334
22	escritorio 4	75	450	446	448	446	450	448
23	escritorio 5	75	248	278	248	248	248	248
24	escritorio 6	75	294	287	295	287	295	291
25	escritorio 5	75	324	324	323	323	324	323,5
26	levantamiento de muro de ladrillo	75	70	68,5	68,5	68	516	292
27	levantamiento de muro de ladrillo	75	76	80	80	76	80	78
28	revoque con lechada	75	75	70	69	69	75	72
29	revoque con lechada	75	80	82	81	80	82	81
30	revoque con lechada	75	28	27	30	27	30	28,5
31	revoque con lechada	75	80	81	80	80	81	80,5
32	Cortado de varillas para hormigonado	75	110	109	109	109	110	109,5
33	instalacion de tuberias de gas	75	90	91	89	89	91	90
34	instalaciones electricas	75	61,3	60	58,6	58,6	61,3	59,95
35	instalaciones electricas	75	80	75	76	75	80	77,5
36	colocado de piso ceramico	75	95	93,8	93,6	93,6	95	94,3
37	colocado de piso ceramico	75	76	74,3	74,3	74,3	76	75,15

OBSERVACION:

Las mediciones se realizo con un luxometro de propiedad de la Universidad





fantil[illegible]

si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
no cumple	ninguna
si cumple	ninguna
no cumple	ninguna
si cumple	ninguna
no cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
no cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna
si cumple	ninguna

Anexo No. 20: Registro fotográfico de las mediciones de los niveles de iluminación

- HOSPITAL ONCOLOGICO



- HOSPITAL MATERNO INFANTIL



- CONDOMINIO TORRE ALTO VERDE




Anexo No. 22: Registro de dotación de EPPS- Construcción Hospital Oncológico.

ENTREGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL OBRA ONCOLOGICO

marzo de 2017

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA IDENTIDAD	BOTIN	PANTALON	CAMISA	FIRMA DE RECIBIDO
1	FLORES MARTIN		-	-	44 OK - -	
2	CARTAGENA NESTOR		-	-	OVEROL L OK	
3	RAMOS DIONILDO		38	OK	- - - -	
4	PEÑARRIETA FREDDY		-	-	44 OK - -	
5	ARNOLD SERGIO	5815895	42	OK	44 OK L OK	
6	AYUPE MARCELO	5651694	41	OK	42 OK L OK	
7	BLADES KELLY	7181775	37	OK	40 OK S OK	
8	BUSTILLOS BORIS	5048317	42	OK	44 OK XL OK	
9	CASTRO ANTONIO	3497771	39	OK	48 OK XXL OK	
10	ENCINAS RICHARD	4577238	42	OK	42 OK L OK	
11	GUTIERREZ CAROLINA	10707236	37	OK	38 OK S OK	
12	JURADO VLADIMIR	5034914	41	OK	50 OK XL OK	
13	QUEIROLO RICHARD		-	-	48 OK XXL OK	
14	TAPIA JAIME	5596775	41	OK	40 OK L OK	
15	VELASCO WIDEN	3909636	39	OK	42 OK S OK	
16	VILLARROEL YURI	2961042	40	OK	44 OK L OK	
17	YUCRA JOSE	5728527	40	OK	42 OK M OK	
18	JHONNY GONZALES		40	OK	40 OK M OK	
19	CARTAGENA NESTOR		-	-	40 OK M OK	


Lic. Juan Jose Rios
Almacén Construmat Ltda.

Totales entregados					
Botin	Pantalon		Camisa		
37	2	38	1	S	3
38	1	40	4	M	3
39	2	42	4	L	6
40	3	44	5	XL	2
41	3	46	0	XXL	2
42	3	48	2		
43	0	50	1		
44	0	52	0		
45	0	54	0		
14		17			16

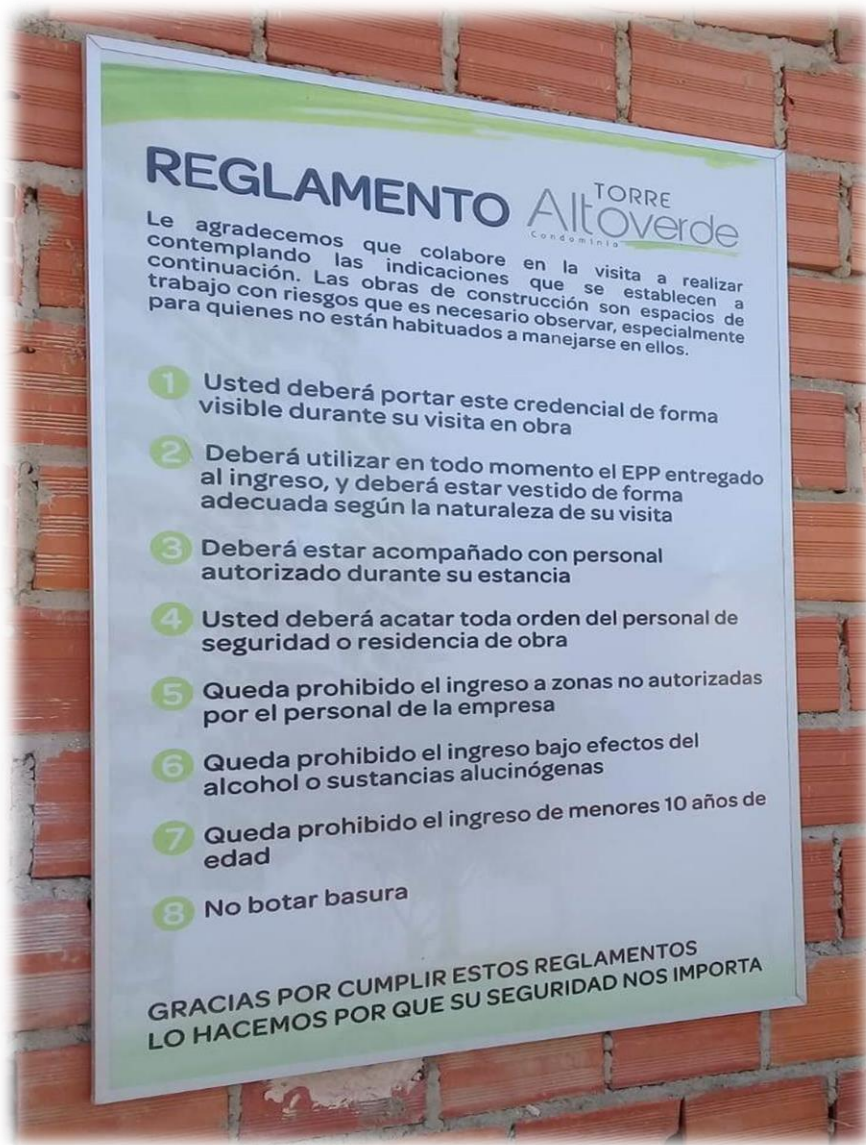
Anexo No. 23: Señalización Auditiva -Construcción Hospital Oncológico.



Anexo No. 24: Señalización-Construcción Condominio Torre Alto Verde.



- Se puede observar la falta de señalización dentro la construcción



- Ese mural es la única señalización existente en obra

Anexo No. 25: Registro de dotación de EPPS- Construcción Puente 4 de Julio.

PLANILLA DE ENTREGA DE EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL)

CIUDAD: TARIJA
 PROYECTO: PUENTE 4 DE JULIO
 FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2018
 RESPONSABLE: ARQ. IVON MALDONADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	BOTAS	PANTALON	CAMISA	CHALECO	GUANTES	CASCO	GAFAS	PROYECTO	FIRMAS
1	Freddy Caseros Mamun	113332403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 113332403
2	Josue Solis Gonzales	826999418	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 826999418
3	Ricardo Ruiz Perez	80970275	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 80970275
4	Roberto Vilca	773480530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 773480530
5	Oscar Guillermo Chocay	3674081 PT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 3674081 PT
6	Ricardo Torro	586698930	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 586698930
7	Liliana Duran	781139355	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 781139355
8	Leiden Sanchez	106930167	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 106930167
9	Maria Isabel Alvaro	503984075	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 503984075
10	Alfonso Segui Vazquez	758540172	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 758540172
11	Elvira Ramos Castellon	784828150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Firma] 784828150
12											

MUROS

MIDO FAS 2000

3 AUDITIVOS MUROS
2 GAFAS
(Paulant
17-07-18.

PINTOR

	OVEROL	BOTIN	FICHA
WILBER CARMONA	1	1	1
YHONY GOZMAN	1	1	

AMADO

DAVID OCAÑO	1 AUDITIVO	FICHA
BERNARDO RAMOS	1 AUDITIVO	FICHA
CRISTOBAL GARCIA	1 BOTIN 40	FICHA
ALEXIS DAYON	1 BOTIN 40	FICHA
GRUPO CUNDA	BOTAS 40	FICHA
LEONARDO YAGUINZA	CL-768064	OTRO L
		BOTAS 42
BENITO SANCHEZ	CL-1059021	BOTAS 40

26-09-18

LEONARDO LEBEZMA CL-1397662 / BOTAS 41

**CONTRATISTA
CANDIDO SORUCO**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	OVEROL	BOTINES	OBSERVACIONES
1	Candido Soruco	1371908	Entregado	42	
2	Ricardo Soruco	5001426	Entregado	40	

CABOPA JORNALEROS

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	OVEROL	BOTINES	OBSERVACIONES
1	Carlos Rene Condori Flores	6957221	XL	41	
2	Rosendo Gira		Entregado	40	

**CONTRATISTA
HUGO SANDOVAL**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	OVEROL	BOTINES	OBSERVACIONES
1	Hugo Sandoval	5040364	Entregado	40	
2	Sergio Alvarez	5781695	Entregado	38	
3	Juan Armando Colque	7253361	Entregado	40	
4	Lucio Armella	1855497	Entregado	40	
5	Roberto Pimentel	7143928	Entregado	40	

**CONTRATISTA
HIPOLITO PORTAL**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.	OVEROL	BOTINES	OBSERVACIONES
1	Santiago Portal			41	
2	Tomas Portal			41	

Anexo No. 28: Señalización- Construcción Materno Infantil

Es Obligatorio el uso de los EPP según el tipo de trabajo:

CONSTRUCTORA CABOPA S.R.L.

En Altura

Con Soldadura

De Albañilería

Con Amoladora o Perforadora

Con Manipulación de Sustancias Químicas

De Mantenimiento Eléctrico

Sr. Visitante
Es Obligatorio el uso de:

Protector



The image shows a vertical safety sign for CONSTRUCTORA CABOPA S.R.L. The sign lists six types of work with their corresponding required PPE icons: En Altura (helmet, goggles, fall protection, safety harness), Con Soldadura (welding mask, gloves, safety harness), De Albañilería (goggles, earmuffs, safety boots, gloves, safety harness), Con Amoladora o Perforadora (earmuffs, safety boots, gloves, safety harness), Con Manipulación de Sustancias Químicas (goggles, gloves, safety harness), and De Mantenimiento Eléctrico (welding mask, gloves, safety harness). At the bottom, it states 'Sr. Visitante Es Obligatorio el uso de:' followed by icons for earmuffs, safety boots, and a respirator labeled 'Protector'. A full-body illustration of a worker in all this PPE is on the right side of the sign.

Anexo No. 30: Planilla de mediciones de Ruido-Construcción Condominio Torre Alto Verde

PLANILLA DE MEDICION							
INSTALACION : Construccion Condominio Torre Alto Verde				Horario de medicion: 09:00 am-11:00 am 03pm-06-pm			
FECHA DE INICIO: 6 de Octubre				EQUIPO: Sonometro			
FECHA DE FINALIZACION:6 de Noviembre				MODELO: SC-20e Sound Level Meter			
No.	Puesto de trabajo/actividad	Tiempo promedio de exposicion del personal en la jornada (hrs)	Nivel de presion sonora continuo equivalente $L_{Aeq,t}$ (db)			Resultados	OBSERVACIONES
						promedio (db)	
1	Area taller	8	105,3	103	104,2	104,167	No todos los trabajadores cuentan con EPP
2	Cortado de laminas metalicas-taller	8	93	90,3	93,2	92,167	El Operador no cuenta con EPP
3	Uso de mezcladora en zanja	8	96,3	94,2	92,8	94,433	El Operador no cuenta con EPP
4	Uso de amoladora	8	103,3	109,2	108,6	107,033	El Operador no cuenta con EPP
5	Uso de combo	8	110,6	111,3	110,9	110,933	El Operador no cuenta con EPP
6	Revoque interior	8	82,1	79,3	78,6	80,000	El Operador no cuenta con EPP
7	Revoque interior de cemento	8	79,3	85,3	84,2	82,933	El Operador no cuenta con EPP
8	Oficina	8	26,3	25,1	20,3	23,900	Ninguna
9	Sierra electrica	8	106	106,5	107	106,500	El Operador no cuenta con EPP
10	Sierra de concreto ladrillo	8	103	101,8	103,6	102,800	El operador si cuenta con EPP
11	Uso de volqueta	8	107	107,5	108,3	107,600	El Operador no cuenta con EPP
12	Camion mixer + bomba hormigon	8	103,3	103,4	103,6	103,433	No todos los trabajadores cuentan con EPP
13	Excavadora	8	101,5	101,8	102,9	102,067	El Operador no cuenta con EPP
14	Vibrador de hormigon	8	105,2	106,3	99,1	103,533	El Operador no cuenta con EPP
15	Retroexcavadora	8	106,4	103,5	105	104,967	El Operador no cuenta con EPP


Anexo No. 31: Planilla de mediciones de Ruido-Construcción Puente 4 de Julio.

PLANILLA DE MEDICION							
INSTALACION : Construccion Puente 4 de Julio				Horario de medicion: 09:00 am-11:00 am 03pm-06-pm			
FECHA DE INICIO: 10 de Agosto				EQUIPO: Sonometro			
FECHA DE FINALIZACION:10 de Septiembre				MODELO: SC-20e Sound Level Meter			
No.	Puesto de trabajo/actividad	Tiempo promedio de exposicion del personal en la jornada (hrs)	Nivel de presion sonora continuo equivalente $L_{Aeq,t}$ (db)			Resultados	OBSERVACIONES
						promedio (db)	
1	Area taller	8	89,9	102,6	106	99,500	No todos los trabajadores cuentan con EPP
2	Cortado de barillas de acero	8	95	98	98,3	97,100	El Operador si cuenta con EPP
3	Uso de amoladora	8	106	105,2	102,3	104,500	El Operador si cuenta con EPP
4	Oficina	8	10,2	22,3	15,3	15,933	Ninguna
5	Sierra electrica	8	106	106,5	107	106,500	El Operador si cuenta con EPP
6	Uso de volqueta	8	108,5	103,4	106,8	106,233	El Operador si cuenta con EPP
7	Camion mixer + bomba hormigon	8	103,2	103	104,5	103,567	No todos los trabajadores cuentan con EPP
8	Excavadora	8	102,3	100,3	105,5	102,700	El Operador si cuenta con EPP
9	Vibrador de hormigon	8	105,3	107,8	99,3	104,133	El Operador si cuenta con EPP
10	Retroexcavadora	8	106,8	104,2	102	104,333	El Operador si cuenta con EPP

Anexo No. 32: Planilla de mediciones de Ruido-Construcción Materno Infantil

CONSTRUCTORA CABOPA S.R.L.		PLANILLA DE REGISTRO DE NIVELES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO				Versión: 1				
						Tipo: Registro				
						Página: 1 de 1				
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN PARA PERIODOS O ESTUDIOS MENORES O IGUALES A 8 HORAS O UN TURNO DE										
NOMBRE DE LA EMPRESA/OBRA: CABOPA S.R.L. Construcción Hospital Materno Infantil										
Fecha:		Área de trabajo: Materno Infantil				Equipo:				
Nombre del técnico higienista: Benjamín Albornoz						Modelo del equipo:				
						Serie del equipo:				
No. de medición	Punto de medición	Tipo de ruido	Tiempo Promedio de Exposición del Personal en la jornada (TPE) (hrs)	Nivel de presión sonora (NPS) (máx.) (dB (A))	Nivel de presión sonora (NPS) (med.) (dB (A))	Nivel de presión sonora (NPS) (mín.) (dB (A))	¿Se requiere aplicar estudio de dosimetría?	Fecha de realización	Observaciones y Aclaraciones	Firma
1	Excavación Equip.		3-	82-	75	61	No	05-08-18		
2	Lado Base	Pozolo		81-	75	62-	No	05-08-18		
3	hutor	Gallineta								
4										
5	Csc. Ingreso Equip.		-4-	77	62	55	No	26-10-18		
6	Económico	Pozolo		73	65	58	No	26-10-18		
7		Escalera								
8										
9	Excavación C.P.		-4-	77	68-	61	No	28-02-19		
10	hang	Excau.		79	69	59	No	28-02-19		
11	Planta									
12	trut.									
13										
14	Excavación C.P.									
15	tend. tir.	Gallineta	-2-	70	56	50		29-03-19		
16	Lado A			84	74	66		29-03-19		
17										
18	Excavación	Puntal		75	64	59		22-04-19		
19	Ingreso	C.P.	-4-	77	69	63		22-04-19		
20	Receptor	Excavación								
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

 CONSTRUCTORA CABOPA S.R.L.										PLANILLA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN PARA PERÍODOS O ESTUDIOS MENORES O IGUALES A 8 HORAS O UN TURNO DE TRABAJO - ESTUDIOS GENERALES			NIVELES DE EXPOSICIÓN AL RUIDO	
NOMBRE DE LA EMPRESA: CABOPA S.R.L.					Fecha: 13-10-2017		Equipo:		Modelo del equipo:		Version:			
Área de trabajo:					Nombre del técnico higienista:		Serie del equipo:		Tip:		Re:			
No. de mediciones	Punto de medición	Tipo de ruido	Tiempo Promedio de Exposición del Personal en la jornada (TPE)(Hrs)	Datos del equipo		Nivel de presión sonora (NPS) (máx.) (dB (A))	Nivel de presión sonora continuo equivalente LAeq,T (dB (A)) (*)	Tiempo máximo permisible de exposición (TMPE) para LAeq,T [Hrs] (**)	Dosis de ruido para periodos o estudios menores a 8 horas (***)	¿El tiempo promedio de exposición (TPE) supera el tiempo máximo permisible de exposición	¿Se requiere ejecutar Estudio de Dosimetría?			
				Ponderación	Respuesta									
1	Excavación Coplex		4			75	67-84	59 Min						
2	10					81	75 "	67 "						
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														


 Ing. Víctor Alvarado C.
 CABOPA S.R.L. SEGURIDAD INDUSTRIAL
 13-10-2017

Anexo No. 33: Registro fotográfico de las mediciones de los niveles de ruido





Anexo No. 35: Conformación de comité mixto- Hospital Oncológico


Estado Plurinacional de Bolivia
Hacia un futuro mejor, con trabajo digno

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTA DE POSESIÓN 63/2018

COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En la ciudad de Tarija, a horas 17:30 p.m. del 18 de Octubre de dos mil dieciocho años, se procedió en presencia de la Inspector Departamental de Trabajo - Tarija Abg. José Gonzalo Espinoza P., del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, al acto de Posesión del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional del:

EMPRESA CONSTRUMAT LTDA.

Conformado de la siguiente manera:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES	REPRESENTANTES DE LA EMPRESA
Sr. Victor Antoni Castro Rocha	Sr. Richard Queirolo Rocha
Sr. Néstor Cartagena	Sr. Wilden Velasco Guzmán
Sr. Sergio Arnold	Sr. Jaime Tapia

Asumen los cargos del directorio del Comité Mixto, como:

PRESIDENTE DEL COMITÉ	Sr. Richard Queirolo Rocha (Titular)
SECRETARIO	Sr. Víctor Antoni Castro Rocha (Titular)
VOCALES	Sr. Wilden Velasco Guzmán (Titular)
	Sr. Néstor Cartagena (titular)
	Sr. Jaime Tapia (suplente)
	Sr. Sergio Arnold (suplente)

EL PRESENTE ACTA DE POSESIÓN SE EMITE EN MERITO A LO DETERMINADO EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN RESPECTIVO DE FECHA, 11 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO AÑOS, FACULTA A LOS COMPONENTES DE LA EMPRESA COMO A LOS TRABAJADORES AL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN SU EMPRESA DURANTE LA GESTIÓN 2018-2019.



Estado Plurinacional de Bolivia
Hacia un futuro mejor, con trabajo digno

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

EN CONSTANCIA FIRMAN:

PRESIDENTE DEL COMITÉ MIXTO

Abog. J. Gonzalo Espinosa Páez
INJECCIÓN DEPTAL. DE TRABAJO Y
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
PREVISIÓN SOCIAL



POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y P.S.

Sr. Richard Queirolo Rocha . (Titular)

Sr. Víctor Antoni Castro Rocha . (Titular)

Sr. . Wilden Velasco Guzmán . (Titular)

Sr. Néstor Cartagena . (Titular)

Sr. . Jaime Tapia

Sr. Sergio Arnold

ACTA DE APERTURA

En la ciudad de Tarija, siendo horas 16:28 p.m. del día 30 de julio de 2013.

Yo: Dr. José Gonzalo Espinoza Patzi, en mi calidad de Inspector Departamental de Trabajo de Tarija, procedí a la apertura del libro de Registro de ACCIDENTES, correspondiente a la gestión 2013,

Perteneciente a:

**“EMPRESA CONSTRUMAT
LTDA-”**

El mismo que consta de 200 páginas por las que doy fe.


Dr. José Gonzalo Espinoza Patzi
Inspector Departamental de Trabajo al
Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social



Informe trimestral sobre Accidentes laborales

Empresa constructora Construmat Ltda.

NIT: 1015163029


Código Patronal: 07 - 410 - 0150

Ciudad de tanja. 20 Julio de 2015.

Con el objeto de dar cumplimiento a la presentación trimestral del libro de accidentes laborales, se hace llegar esta acta donde informamos que de fecha 01 de mayo del 2015 a fecha 30 de junio del 2015 no hemos presentado ningún tipo de accidente laboral en el desarrollo del proyecto " Construcción Instituto Oncológico tanja "

Agradecemos a su autoridad la atención, nos despedimos con las consideraciones más distinguidas

 **CONSTRUMAT LTDA.**
EMPRESA CONSTRUCTORA
NIT: 1015163029


Lic. J. Marcelo Ayape Ugarte
JEFE ADM. RECURSOS HUMANOS
ASOCIACION ACCIDENTAL
CONSTRUMAT - AREA - VASTOK



Anexo No. 37: Conformación de comité mixto-Hospital Materno Infantil



Estado Plurinacional de Bolivia

Hacia un futuro mejor, con trabajo digno

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTA DE POSESIÓN 023/16

COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En la ciudad de Tarija, a horas 14:30 p.m. del 13 Mayo de dos mil dieciséis años, se procedió en presencia del Inspector Dptal., de Trabajo - Tarija Dr. Sr. José, del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, al acto de Posesión del Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional de:

CABOPA S.R.L.

Conformado de la siguiente manera:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Sra. Angélica Daniela Carranza.
Sr. Ernesto Cruz.
Sr. Reynaldo Rosario Arce.

REPRESENTANTES DE LA EMPRESA

Sr. Oscar José Fernández.
Sra. María Karla Winnipeg.
Sra. Karina Cecilia Casazola.

Asumen los cargos del directorio del Comité Mixto, como:

PRESIDENTE DEL COMITÉ SECRETARIO VOCALES

Sr. Oscar José Fernández. (Titular)
Sra. Angélica Daniela Carranza. (Titular)
Sra. María Karla Winnipeg. (Titular)
Sr. Ernesto Cruz. (Titular)
Sra. Karina Cecilia Casazola.
Sr. Reynaldo Rosario Arce.

EL PRESENTE ACTA DE POSESIÓN SE EMITE EN MERITO A LO DETERMINADO EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN RESPECTIVO DE FECHA, 24 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS AÑOS Y FACULTA A LOS COMPONENTES AL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN SU EMPRESA.
En constancia firman:



Abog. J. Gonzalo Espinoza Palz
INSPECTOR DPTAL. DE TRABAJO a.i.
MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO y
PREVISIÓN SOCIAL

PRESIDENTE DEL COMITÉ MIXTO

POR EL MINISTERIO DE TRABAJO E. y P.S.
