Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		Modulo 1 Trabajos previos		
2		Instalacion de faenas	2 días	lun 2/7/18
3		LIMPIEZA Y DESBROCE	3 días	mié 4/7/18
4		EXCAV, RELL.COMPACTADO C/MAQUINARIA	20 días	sáb 7/7/18
5		REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS	5 días	mié 1/8/18
6		Letrero de obras	1 día	mar 7/8/18
7		MODULO 2: CONSTRUCCION DE BLOQUE		
8		EXCAVACION DE 0-2 M SUELO SEMIDURO	7 días	mié 8/8/18
9		Relleno y Compactado c/Saltarina S/Mat.	25 días	vie 17/8/18
10		Zapatas de HoAo	55 días	mar 18/9/18
11		Cimiento de HoCo	9 días	mar 18/9/18
12		Muro de mamposteria	8 días	mar 7/8/18
13		IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS	7 días	mar 8/1/19
14		Sobrecimiento de HoCo 50% piedra	7 días	jue 17/1/19
15		Sobrecimiento de HoAo	14 días	jue 17/1/19
16		COLUMNAS DE Hº Aº	45 días	sáb 24/11/18
17		VIGA DE HºAº	50 días	sáb 19/1/19
18		MURO DE LADRILLO 6H E=12 (24X18X12)	25 días	vie 22/3/19
19		MURO DE LADRILLO 6H E=18 (24X18X12)	65 días	vie 22/3/19
20		CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO	39 días	lun 4/2/19
21		PISO DE CERAMICA ESMALTADA 40 cm x 40cm	36 días	sáb 23/3/19
22		PISO VINILICO 60cm x 60cm	5 días	sáb 23/3/19
23		PISO DE CERAMICA SIN ESMALTE 30cm x 30cm	15 días	sáb 23/3/19
24		ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	26 días	mié 8/5/19
25		ZOCALO DE CERAMICA SIN ESMALTE	6 días	jue 11/4/19
26		ZOCALO DE CEMENTO H=0.20M	10 días	vie 29/3/19
27		Cubierta de teja colonial s/ Estr. Metalica	10 días	jue 25/4/19
28		PARASOL DE MADERA QUINA CON P/SINTETICA	8 días	vie 22/3/19
29		REVOQUE INT. CAL-CEMENTO	75 días	mié 12/6/19
30		REVOQUE EXT. CAL-CEMENTO-ARENA (FACHADA)	32 días	mié 12/6/19
31		PINTURA INTERIOR LATEX	45 días	vie 13/9/19
32		PINTURA EXTERIOR LATEX	29 días	lun 22/7/19
33		REVESTIMIENTO C/CERAMICA ESMALTADA	40 días	mié 12/6/19
34		junta de dilatacion	6 días	vie 22/3/19
35		Escalera	14 días	vie 22/3/19
36		Estructura metalica	27 días	vie 22/3/19
37		cielo falso	40 días	lun 6/5/19
38		losa aligerada	35 días	vie 22/3/19
39		puertas	26 días	sáb 29/6/19
40		ventanas	29 días	sáb 29/6/19
41		Dinteles de HºAº	14 días	mié 12/6/19
42		PINTURA SINTETICA PUERTAS Y VENTANAS	20 días	jue 1/8/19
43		MESON DE Hº Aº INC / REVEST CERAMICO NAL	8 días	mar 25/6/19
44		PROV/COL LAVAMANOS C/PEDES. C/GRIFO+ACCE	6 días	lun 26/8/19
45		PROVISION/INSTALACION INODORO TANQUE BAJO	8 días	lun 2/9/19
46		TOALLERO	2 días	lun 26/8/19
47		JABONERO	3 días	mié 28/8/19
48		PORTA PAPELES	3 días	sáb 31/8/19
49		INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	5 días	vie 30/8/19
50		PROV/COL LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 1 POZA	2 días	lun 26/8/19
51		PROV/COL LAVAPLATO ACERO INOXIDABLE 2 POZA	2 días	mié 28/8/19
52		Limpieza general de la obra y desmovilizacion	10 días	jue 5/9/19
53		Placa de entrega de obra	2 días	mié 18/9/19

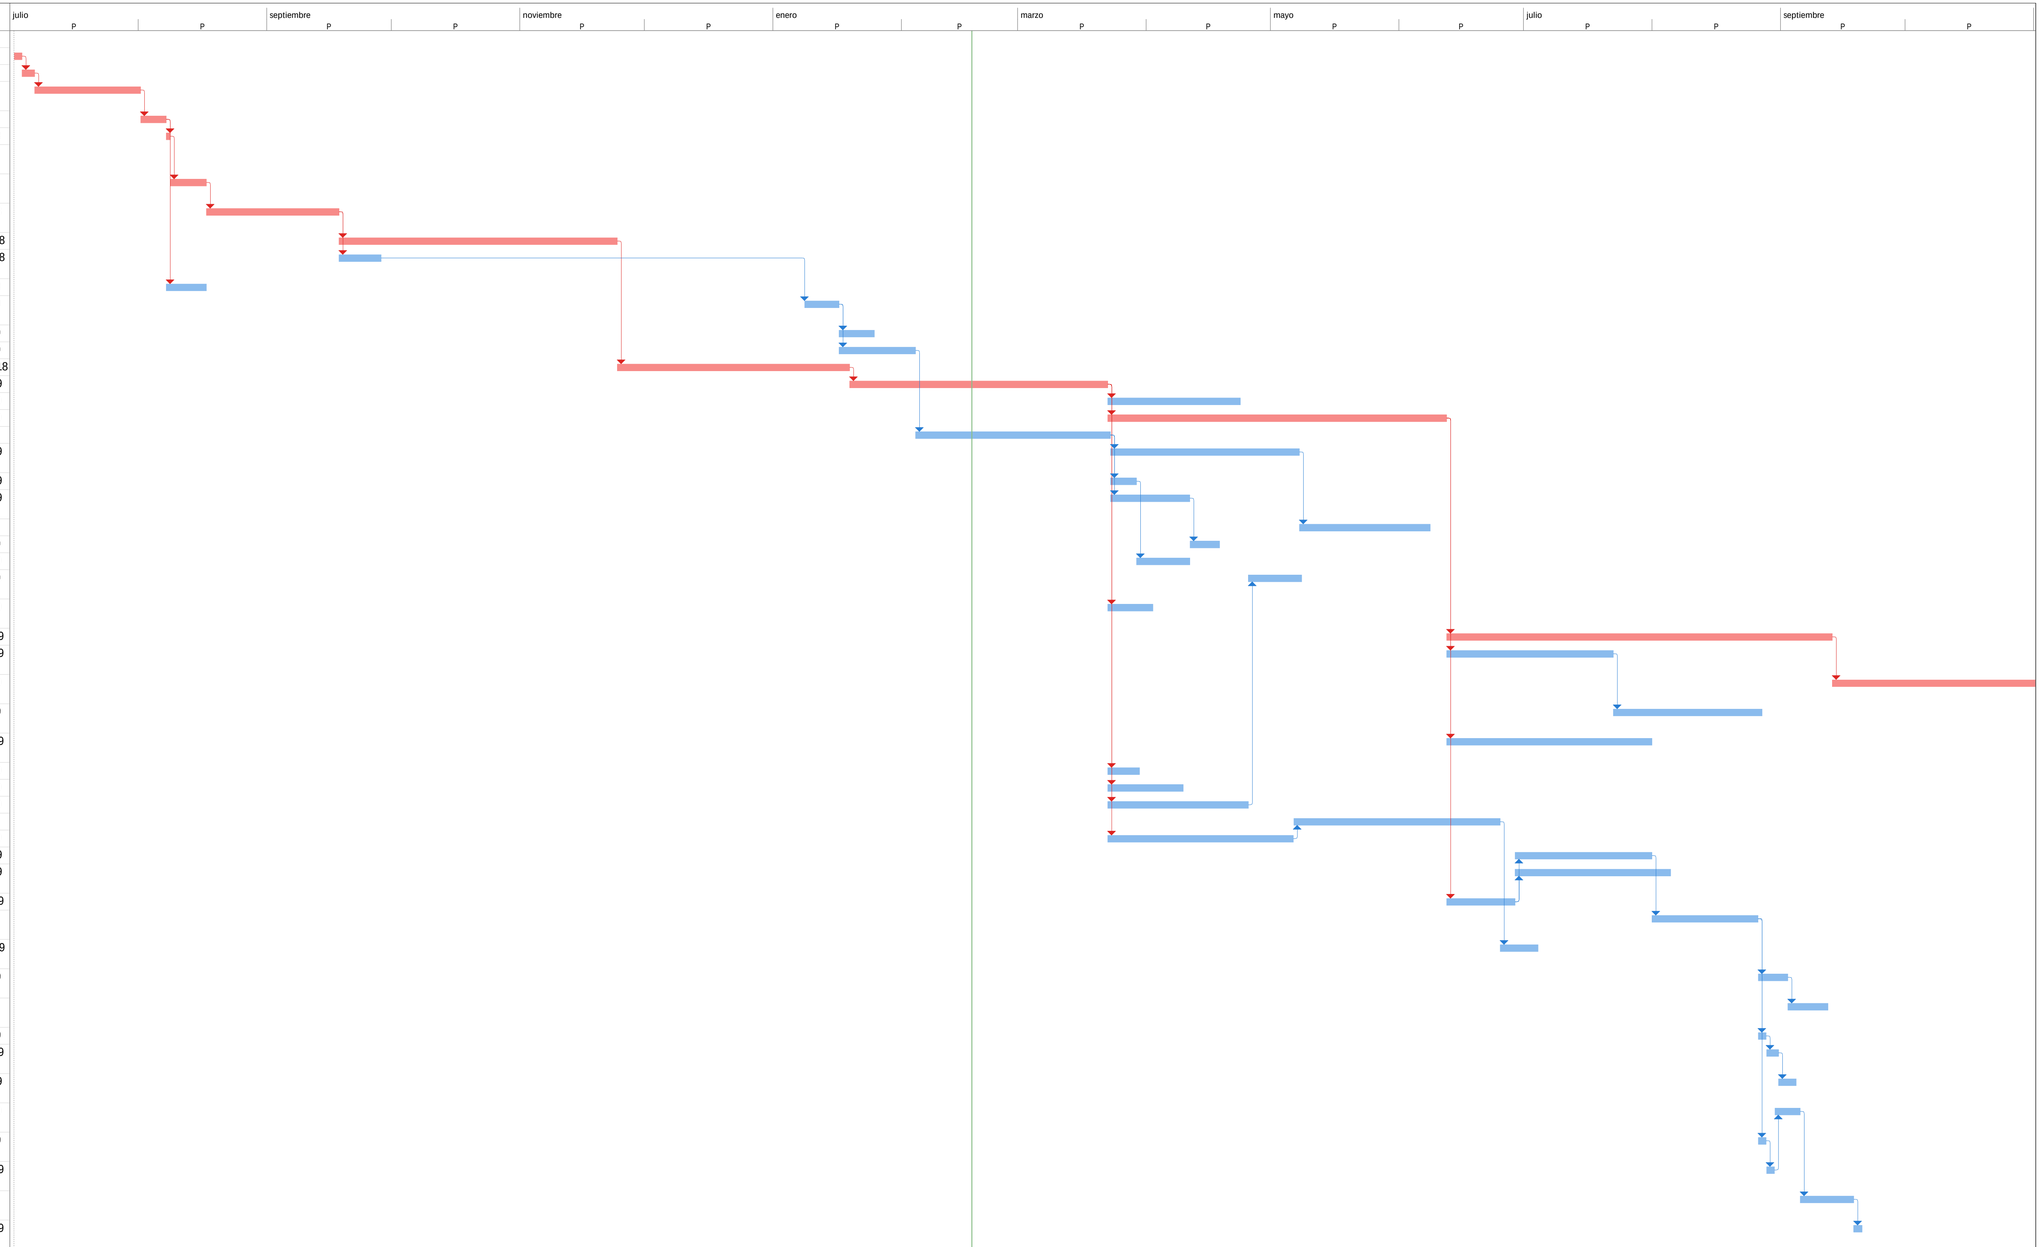

Proyecto: cronograma de trana
Fecha: lun 18/2/19

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
