## CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA CON LOSA ALIVIANADA

| N° | DESCRIPCION ITEM | UND. | CANT. | DURACION (DIAS) (*) |
|---|---|---|---|---|
| | **MODULO N°1: ACTIVIDADES GENERALES** | | | |
| 1 | REPLANTEO Y TRAZADO | m2 | 300,00 | 1 |
| 2 | EXCAVACION TERRENO SEMIDURO CON MAQUINARIA | m3 | 156,98 | 1 |
| 3 | HORMIGON POBRE PARA NIVELACIÓN | m3 | 3,03 | 1 |
| 4 | ZAPATAS DE HºAº | m3 | 22,45 | 5 |
| 5 | CIMIENTOS DE HºAº | m3 | 19,62 | 9 |
| 6 | SOBRECIMIENTO DE HºAº | m3 | 32,72 | 13 |
| 7 | IMPERMEABILIZACION DEL SOBRECIMIENTO | m2 | 32,70 | 1 |
| 8 | COLUMNAS DE HºAº | m3 | 32,88 | 14 |
| 9 | VIGAS DE HºAº | m3 | 55,82 | 12 |
| 10 | ESCALERAS DE HºAº | m3 | 11,24 | 7 |
| 11 | LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORM H=20 cm | m2 | 851,68 | 20 |
| 12 | MURO DE LADRILLO 6H | m2 | 1.734,17 | 37 |
| 13 | EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN | m2 | 94,33 | 2 |
| 14 | PISO DE CERAMICA | m2 | 732,51 | 29 |
| 15 | ZOCALOS DE CERAMICA | m | 124,94 | 2 |
| 16 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | m2 | 2.260,54 | 53 |
| 17 | REVOQUE EXTERIOR CAL-CEMENTO | m2 | 959,68 | 39 |
| 18 | CIELO RASO BAJO LOSA | m2 | 851,68 | 27 |
| 19 | PINTURA INTERIOR LATEX | m2 | 2.260,54 | 22 |
| 20 | PINTURA EXTERIOR LATEX | m2 | 959,68 | 10 |

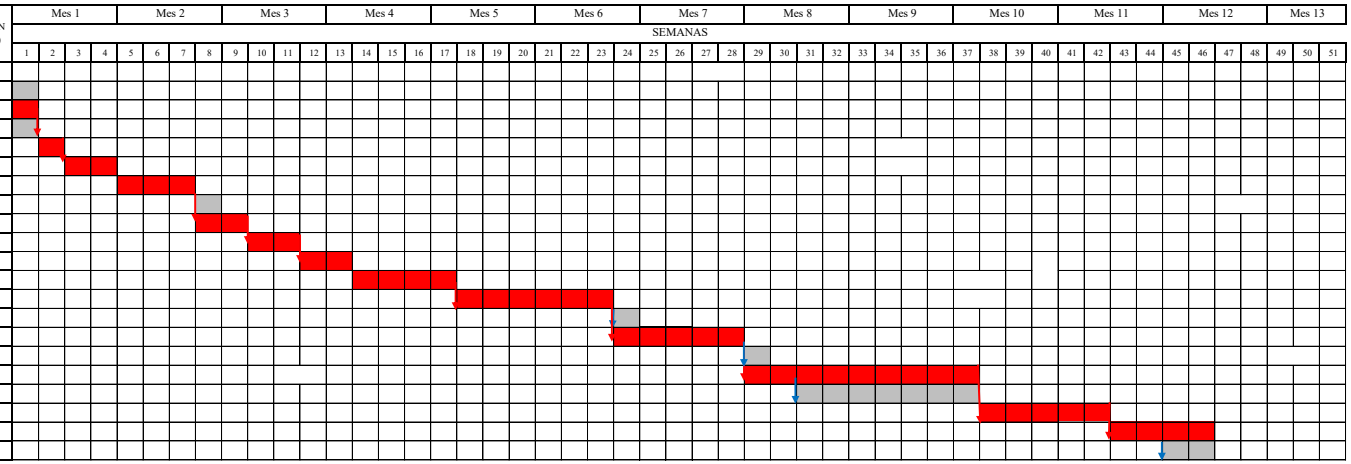


Tiempo de ejecucion de obras = 44 semanas = 305 días calendario

ruta crítica
