ANEXO Nº 12

Cronograma De Ejecución

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**Proyecto**	**228 días**	**lun 01/06/20**	**jue 15/04/21**
2		**Inicio**	0 días	lun 01/06/20	lun 01/06/20
3		Limpieza general de obras	2 días	lun 01/06/20	mié 03/06/20
4		Instalacion de faenas	1 día	mié 03/06/20	jue 04/06/20
5		Letrero de obras	1 día	jue 04/06/20	vie 05/06/20
6		Replanteo y trazado	1 día	jue 04/06/20	vie 05/06/20
7		Excavacion de 0-2 m suelo semiduro	17 días	vie 05/06/20	mar 30/06/20
8		Base de hormigon pobre	3 días	mar 30/06/20	vie 03/07/20
9		Zapata de hormigón armado	24 días	vie 03/07/20	jue 06/08/20
10		Relleno y compactado con material comun	8 días	jue 06/08/20	mar 18/08/20
11		Columna de hormigón armado	15 días	mar 18/08/20	mar 08/09/20
12		Sobrecimientos HºAº	7 días	mar 08/09/20	jue 17/09/20
13		Vigas de hormigon armado	30 días	mar 08/09/20	mar 20/10/20
14		Losa armada en 2 direcciones (50×50)	55 días	mar 20/10/20	mar 05/01/21
15		Losa llena de hºaº	16 días	vie 16/10/20	lun 09/11/20
16		Estructura metalica	6 días	mar 05/01/21	mié 13/01/21
17		Estructura c/vidrio templado 10mm	3 días	mar 05/01/21	vie 08/01/21
18		Prov. y coloc. de policarbonato 10mm para cubierta	5 días	mié 13/01/21	mié 20/01/21
19		Reja metalica tubular rectangular de 20x40 mm	4 días	mar 20/10/20	lun 26/10/20
20		Baranda tubo redondo d = 2 y d = 1 1/2	9 días	lun 09/11/20	vie 20/11/20
21		Impermeabilizacion de sobrecimientos	2 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20
22		Muro de ladrillo 6H e=0,12 m	24 días	mar 08/09/20	lun 12/10/20
23		Dintel de ladrillo armado	4 días	lun 28/09/20	vie 02/10/20
24		Revoque exterior cal cemento	32 días	lun 12/10/20	mié 25/11/20
25		Revoque interior de yeso sobre muro de ladrillo	34 días	lun 12/10/20	vie 27/11/20
26		Cielo raso	24 días	lun 04/01/21	vie 05/02/21
27		Revestimiento ceramica esmaltada nal.	19 días	mié 25/11/20	mar 22/12/20
28		Contrapiso cemento h=8 cm + empedrado	9 días	lun 12/10/20	vie 23/10/20
29		Meson de h°a° con revest. Azulejo	3 días	vie 23/10/20	mié 28/10/20
30		Piso ceramica esmaltada alto trafico c/textura	28 días	vie 05/02/21	mié 17/03/21
31		Zocalos de ceramica	8 días	mié 17/03/21	lun 29/03/21
32		Panel divisorio para baño	4 días	lun 29/03/21	vie 02/04/21
33		Ventana corredizas de aluminio c/vidrio	7 días	lun 12/10/20	mié 21/10/20
34		Puerta de madera tipo tablero c/marco	18 días	lun 12/10/20	jue 05/11/20
35		Puerta de vidrio templado de 10 mm	2 días	lun 12/10/20	mié 14/10/20
36		Puerta para baños	18 días	lun 12/10/20	jue 05/11/20
37		Prov y coloc chapa	2 días	jue 05/11/20	lun 09/11/20
38		Prov y coloc chapa p/baños	1 día	jue 05/11/20	vie 06/11/20
39		Estructura c/vidrio templado 10mm	3 días	lun 12/10/20	jue 15/10/20
40		Pintura en interiores latex o similares	9 días	lun 29/03/21	vie 09/04/21
41		Pintura en exteriores latex o similar	4 días	vie 09/04/21	jue 15/04/21
42		Pintura al oleo cielo raso	11 días	vie 05/02/21	lun 22/02/21
43		**Fin**	0 días	jue 15/04/21	jue 15/04/21

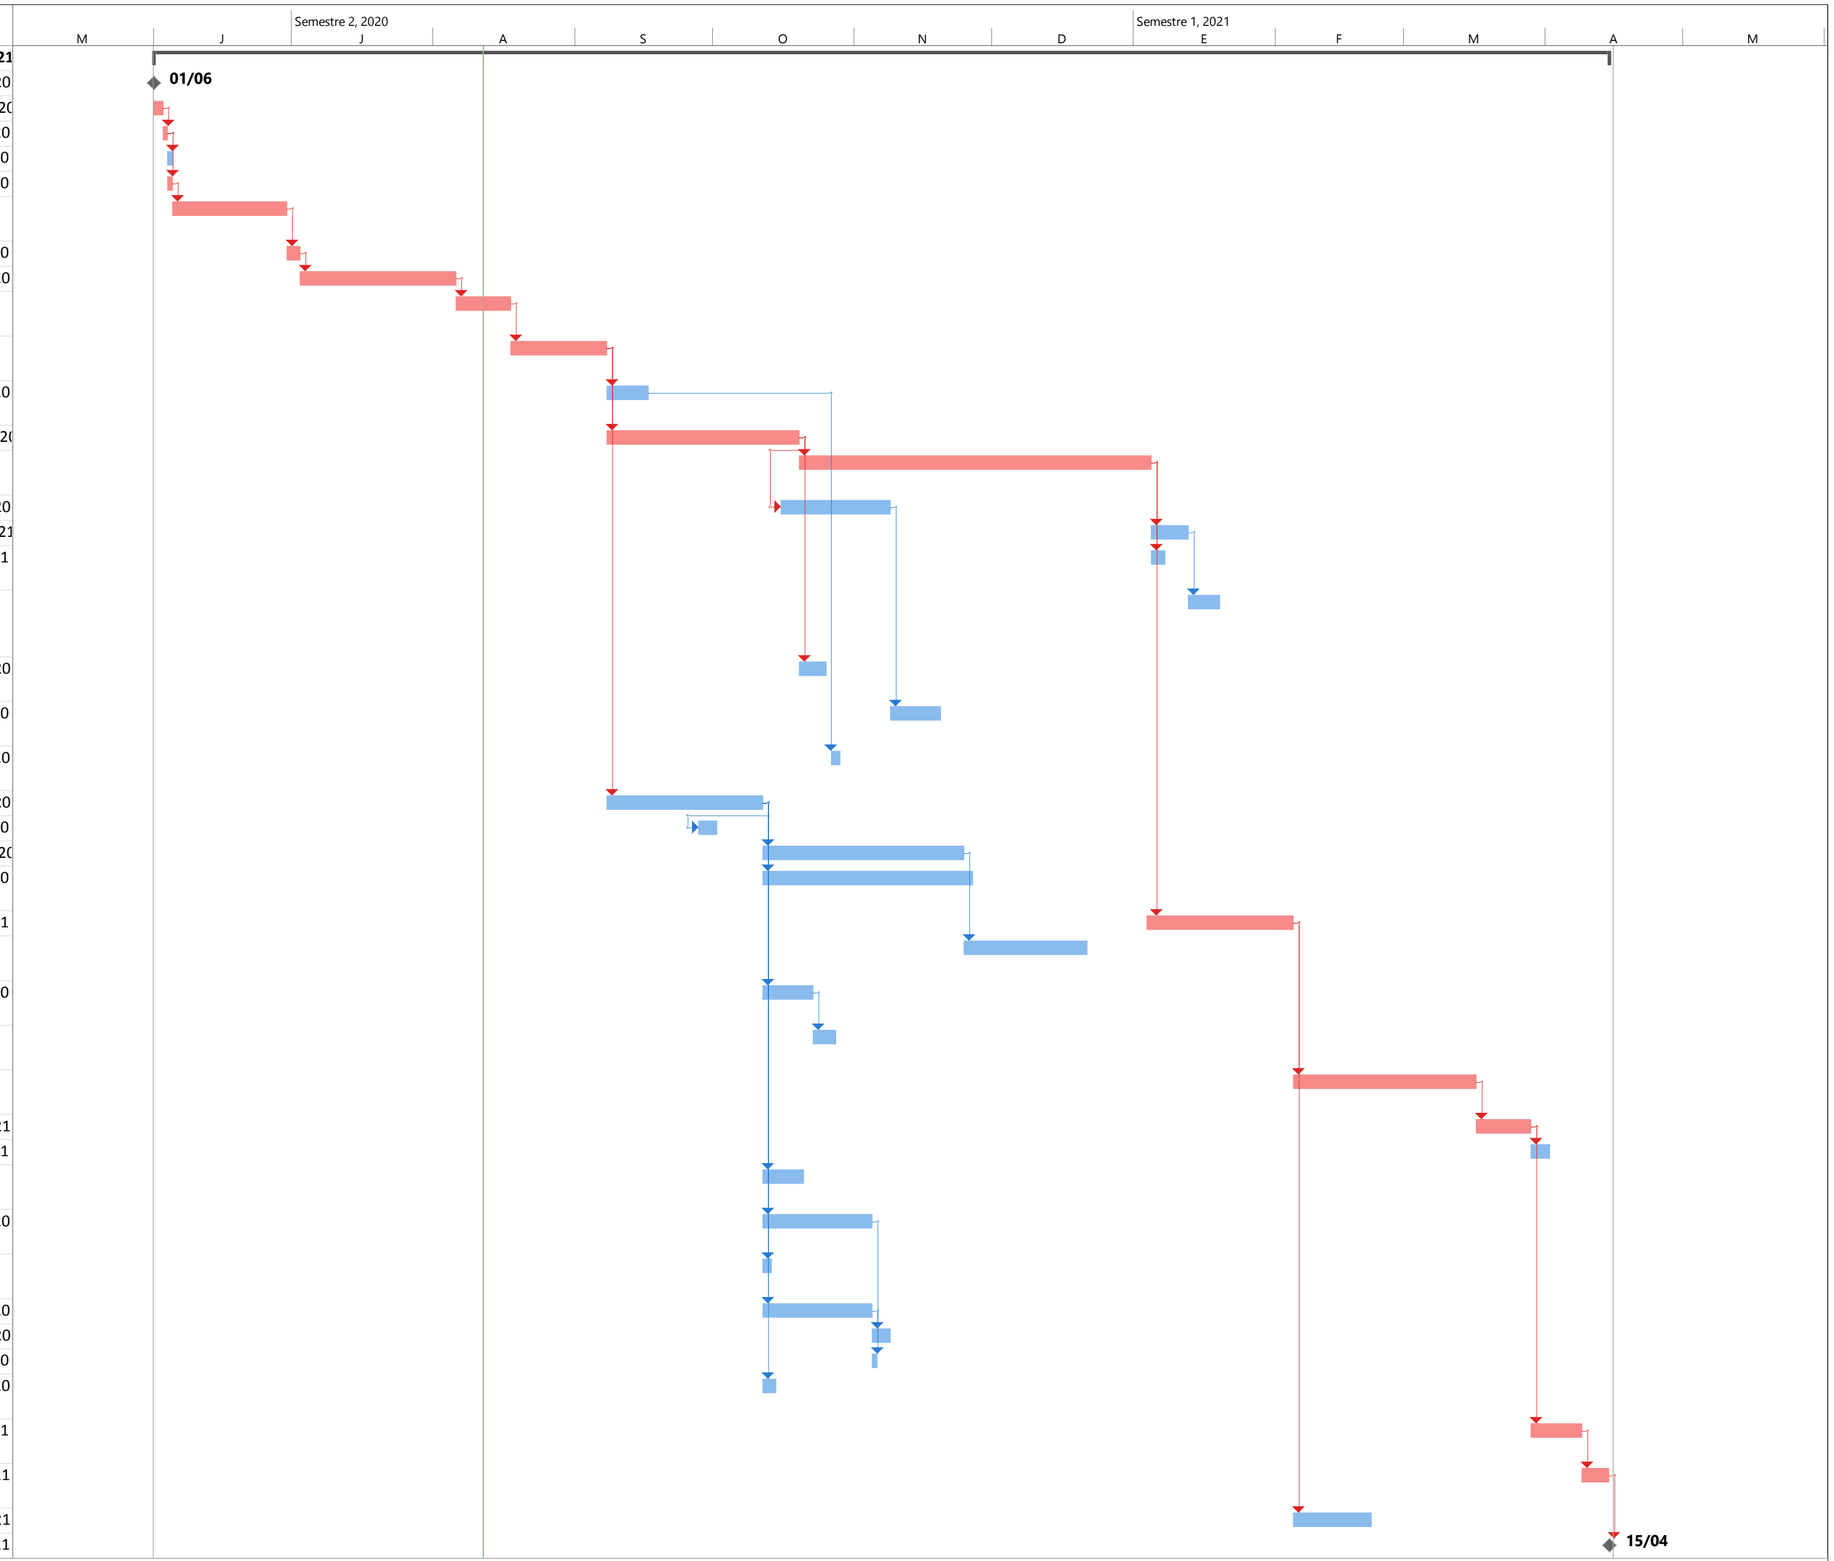

Proyecto: Cronograma
Fecha: mié 12/08/20

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
