


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	tri 1, 2020							tri 2, 2020		
								dic	ene	feb	mar	abr	may	jun			
1			PROYECTO CASA FISCAL	558 días	lun 06/01/20	mié 23/02/22											
2			Limpieza y desmonte	4 días	lun 06/01/20	jue 09/01/20											
3			Instalación de faenas	3 días	vie 10/01/20	mar 14/01/20	2										
4			Trazado y replanteo	2 días	mié 15/01/20	jue 16/01/20	3										
5			Excavación con maquinaria (0-4,65m)	6 días	vie 17/01/20	vie 24/01/20	4										
6			Relleno y compactado c/saltarín s/material	7 días	lun 27/01/20	mar 04/02/20	5										
7			Carpeta de hormigón pobre	4 días	mié 05/02/20	lun 10/02/20	6										
8			Hormigón losas de cimentación fck=210kg/cm2	70 días	mar 11/02/20	lun 18/05/20	7										
9			Hormigon zapata lineal	61 días	mar 11/02/20	mar 05/05/20	7										
10			Impermeabilización de sobre cimientos	11 días	mar 19/05/20	mar 02/06/20	8										
11			Hormigón columnas fck=210 kg/cm2	48 días	mar 19/05/20	jue 23/07/20	8										
12			Hormigón vigas fck=210kg/m2	80 días	vie 24/07/20	jue 12/11/20	11										
13			Hormigón muros fck=210kg/cm2	44 días	mar 19/05/20	vie 17/07/20	8										
14			Losa alivianada c/viguetas pretensadas h=20cm	40 días	vie 13/11/20	jue 07/01/21	12										
15			Escalera de hormigón armado fck=210kg/cm2	23 días	vie 13/11/20	mar 15/12/20	12										
16			Contrapiso mas empedrado	28 días	lun 20/07/20	mié 26/08/20	13										

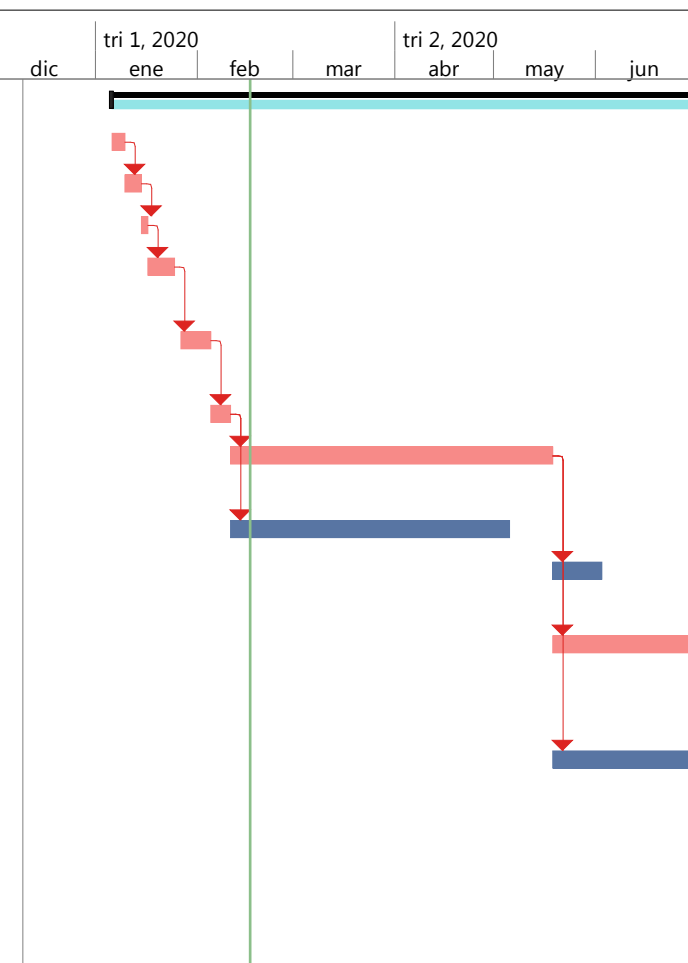


Proyecto: cronograma casa fisc
Fecha: lun 17/02/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor							
								dic	tri 1, 2020 ene	feb	mar	tri 2, 2020 abr	may	jun
17			Muro de ladrillo de 6 huecos e=18cm	179 días	mié 16/12/20	lun 23/08/21	15							
18			Muro de ladrillo de 6 huecos e=12cm	5 días	mié 16/12/20	mar 22/12/20	15							
19			Revoque interior de yeso	180 días	mié 23/12/20	mar 31/08/21	18							
20			Revoque exterior mortero	78 días	mié 23/12/20	vie 09/04/21	18							
21			Prov. y colocado de cielo falso de placas de yeso	134 días	vie 08/01/21	mié 14/07/21	14							
22			Piso de cerámica texturada de alto trafico	19 días	jue 15/07/21	mar 10/08/21	21							
23			Piso de cerámico esmaltado nacional 25*25cm	112 días	jue 15/07/21	vie 17/12/21	21							
24			Zócalo de cerámico esmaltado nacional 25*25cm	16 días	lun 20/12/21	lun 10/01/22	23							
25			Mesón hormigón armado-cocina	10 días	lun 20/12/21	vie 31/12/21	23							
26			Pintura interior látex	78 días	jue 15/07/21	lun 01/11/21	21							
27			Pintura exterior látex	30 días	jue 15/07/21	mié 25/08/21	21							
28			Prov. y colocación de puertas de madera c/marco y accesorios	33 días	lun 12/04/21	mié 26/05/21	20							
29			Prov. y colocación de ventanas de aluminio c/vidrio y accesorios	5 días	lun 12/04/21	vie 16/04/21	20							
30			Provisión y colocación de paneles de división de vidrio	45 días	lun 20/12/21	vie 18/02/22	23							

Proyecto: cronograma casa fisc
Fecha: lun 17/02/20


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo



Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin




Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual




Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	tri 1, 2020						tri 2, 2020		
								dic	ene	feb	mar	abr	may	jun		
31			Prov. y colocación fachada de vidrio	24 días	lun 12/04/21	jue 13/05/21	20									
32			Baranda metálica	3 días	mar 02/11/21	jue 04/11/21	26									
33			Tratamiento para cubierta de losa alivianada	8 días	vie 08/01/21	mar 19/01/21	14									
34			Retiro de escombros	3 días	lun 21/02/22	mié 23/02/22	30									




Proyecto: cronograma casa fisc Fecha: lun 17/02/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: cronograma casa fisc Fecha: lun 17/02/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

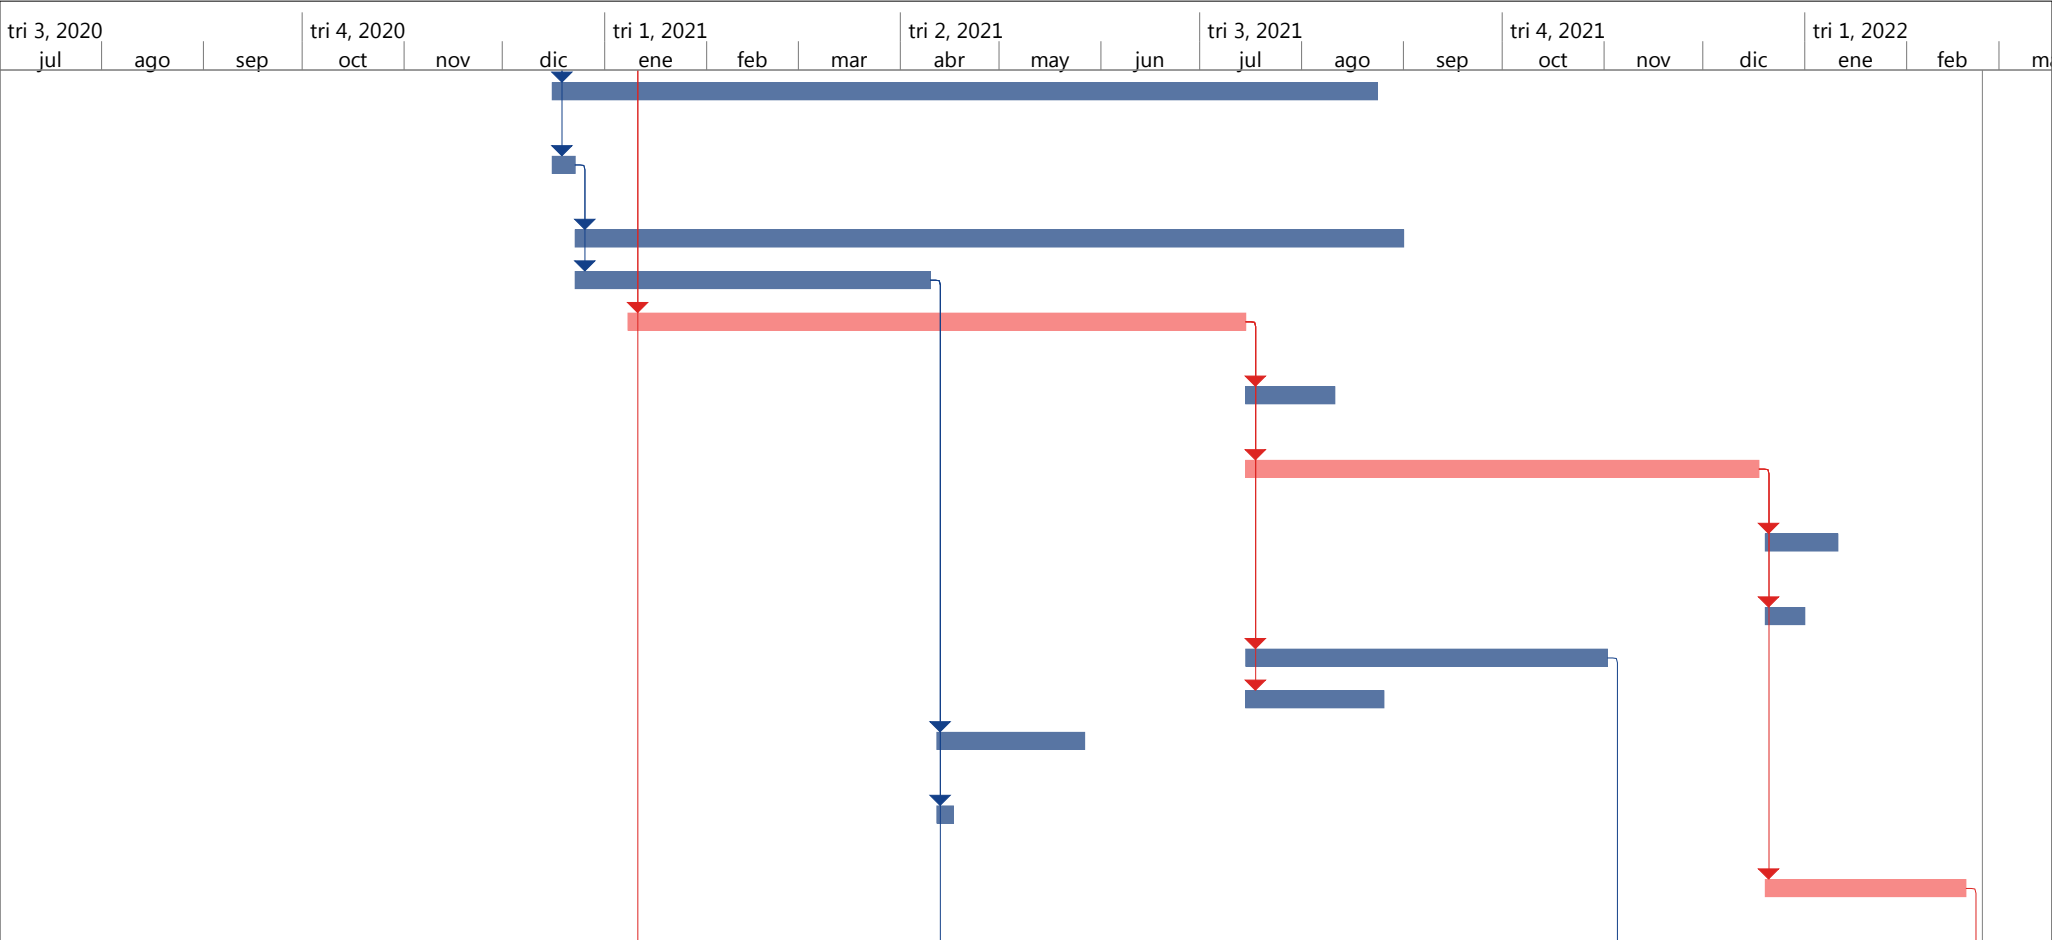

Proyecto: cronograma casa fisc Fecha: lun 17/02/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

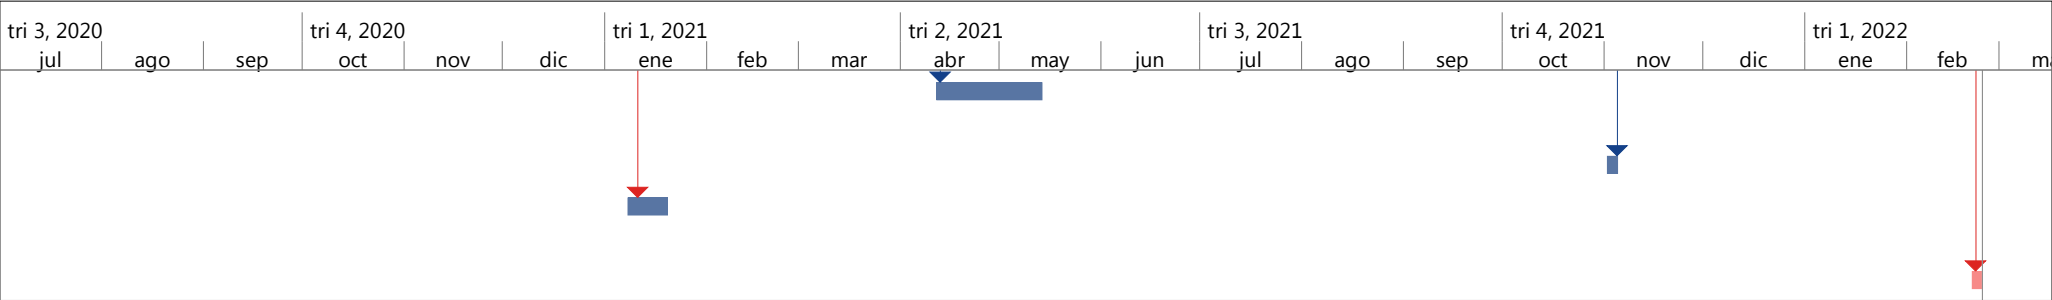

Proyecto: cronograma casa fisc Fecha: lun 17/02/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
